




1. AVANCE - PROYECTO TRISEMANAL EN BIM

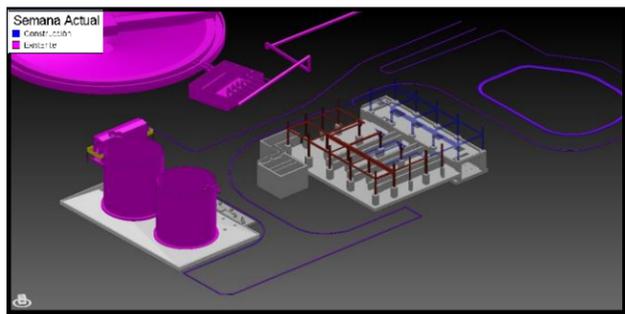


Avance al 28 de diciembre de 2022 - Semana 0

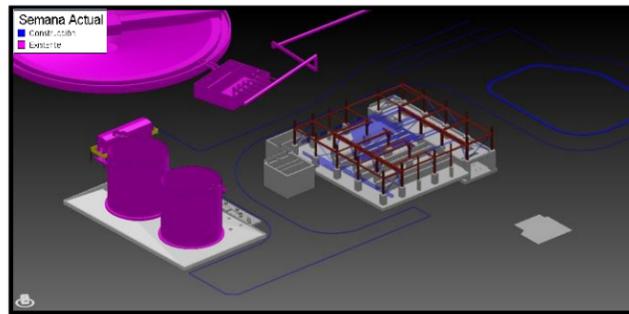

Avance al 04 de enero de 2023 - Semana 1

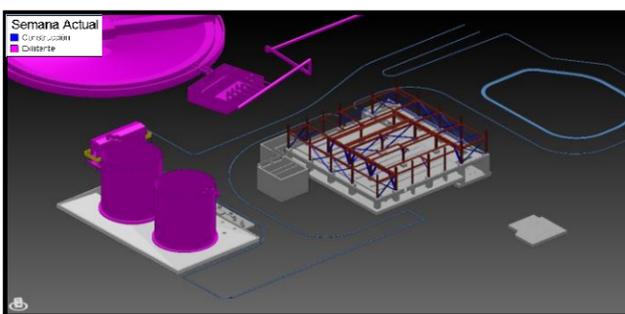


Avance al 11 de enero de 2023 - Semana 2

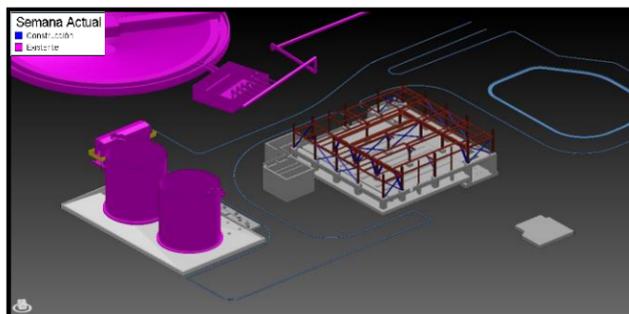


Avance al 18 de enero de 2023 - Semana 3


2. ESTADO SUMINISTRO ESTRUCTURA 1ER NIVEL EDIFICIO FILTRO

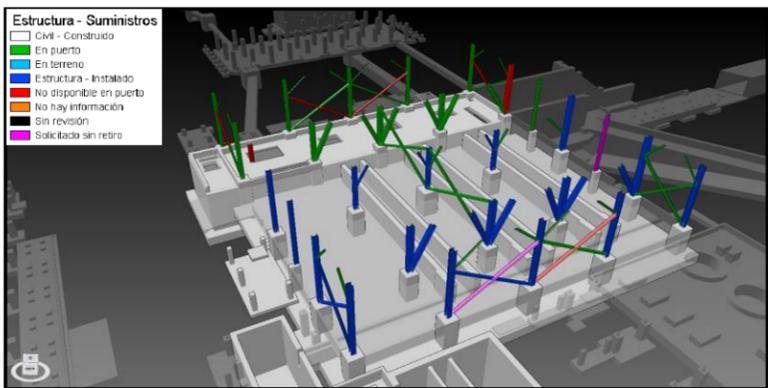


ESTATUS SUMINISTRO DE COLUMNAS Y ARROSTRAMIENTO VERTICALES

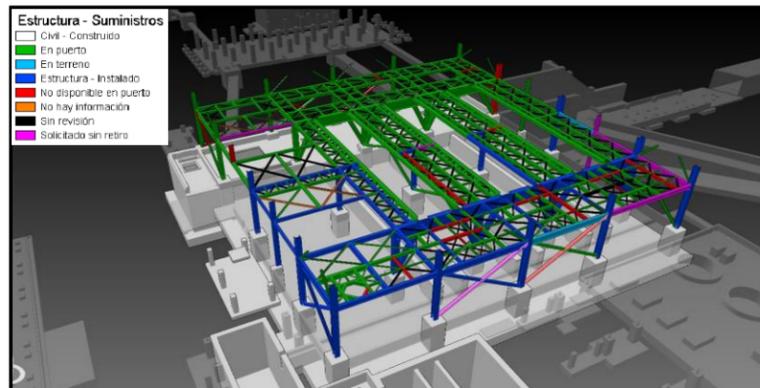


ESTATUS SUMINISTRO DE VIGAS Y ARROSTRAMIENTOS HORIZONTALES - VISTA 1

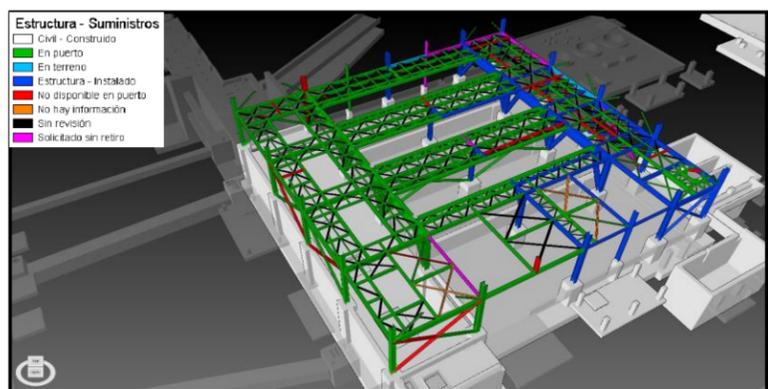

ESTATUS SUMINISTRO DE VIGAS Y ARROSTRAMIENTOS HORIZONTALES - VISTA 2


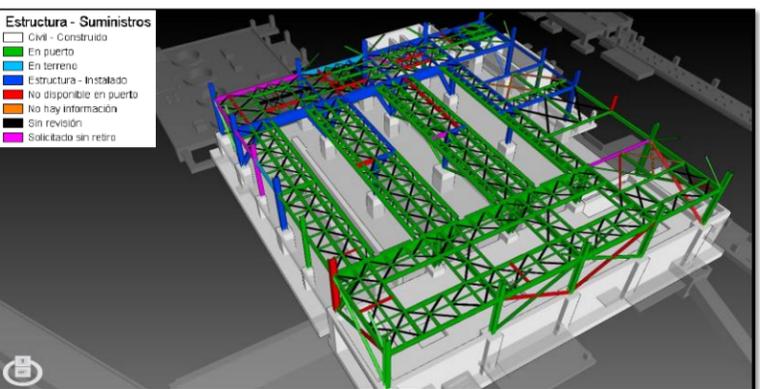


ESTATUS SUMINISTRO DE VIGAS Y ARROSTRAMIENTOS HORIZONTALES - VISTA 3


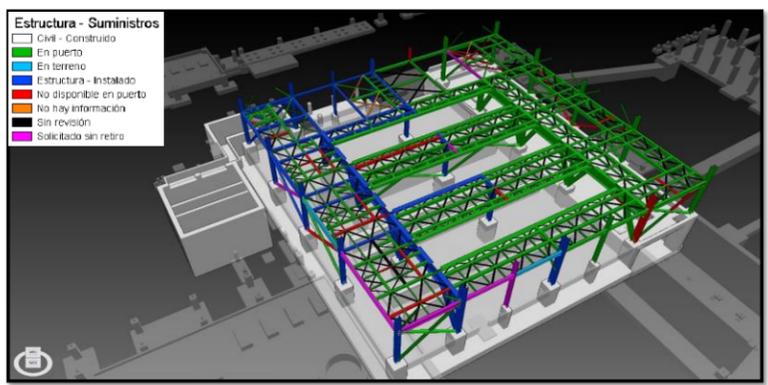


ESTATUS SUMINISTRO DE VIGAS Y ARROSTRAMIENTOS HORIZONTALES - VISTA 4


AVANCE DE ESTRUCTURA			
ITEM	TOTAL	AVANCE	% AVANCE AL 28-12-22
TRASLADO	257.408	93.492	36,3%
MONTAJE	257.408	62.236	24,2%

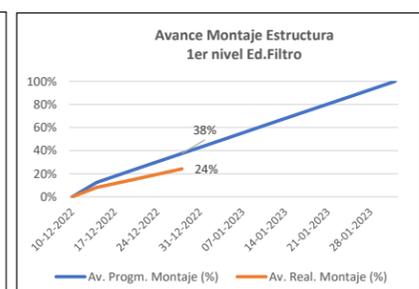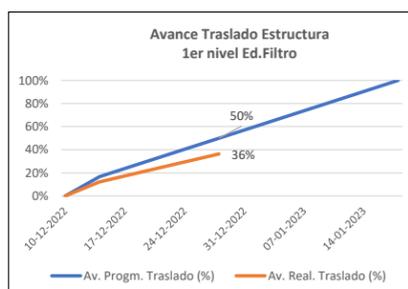

3. ESTADO INGENIERÍA OBRAS CIVILES

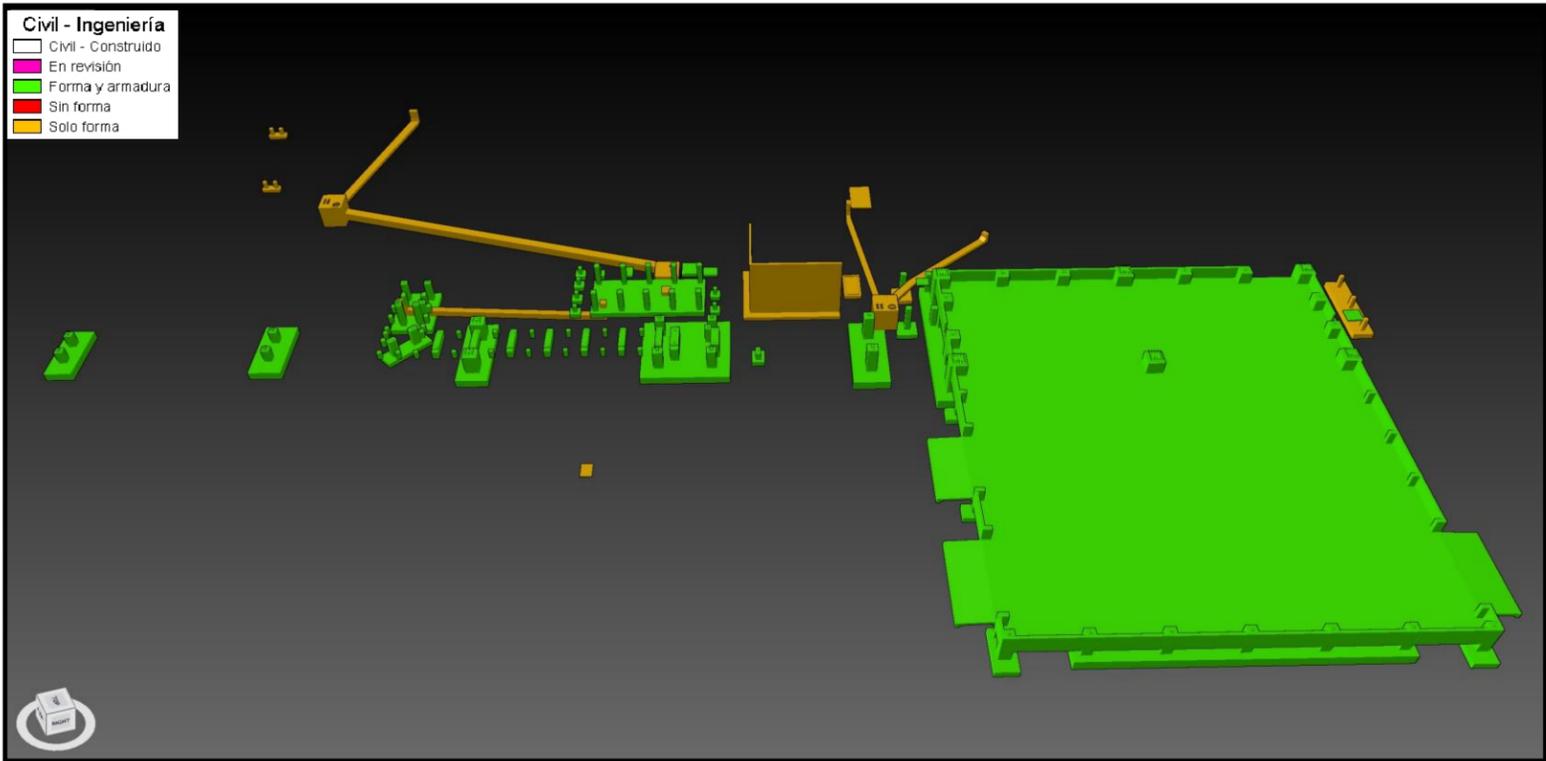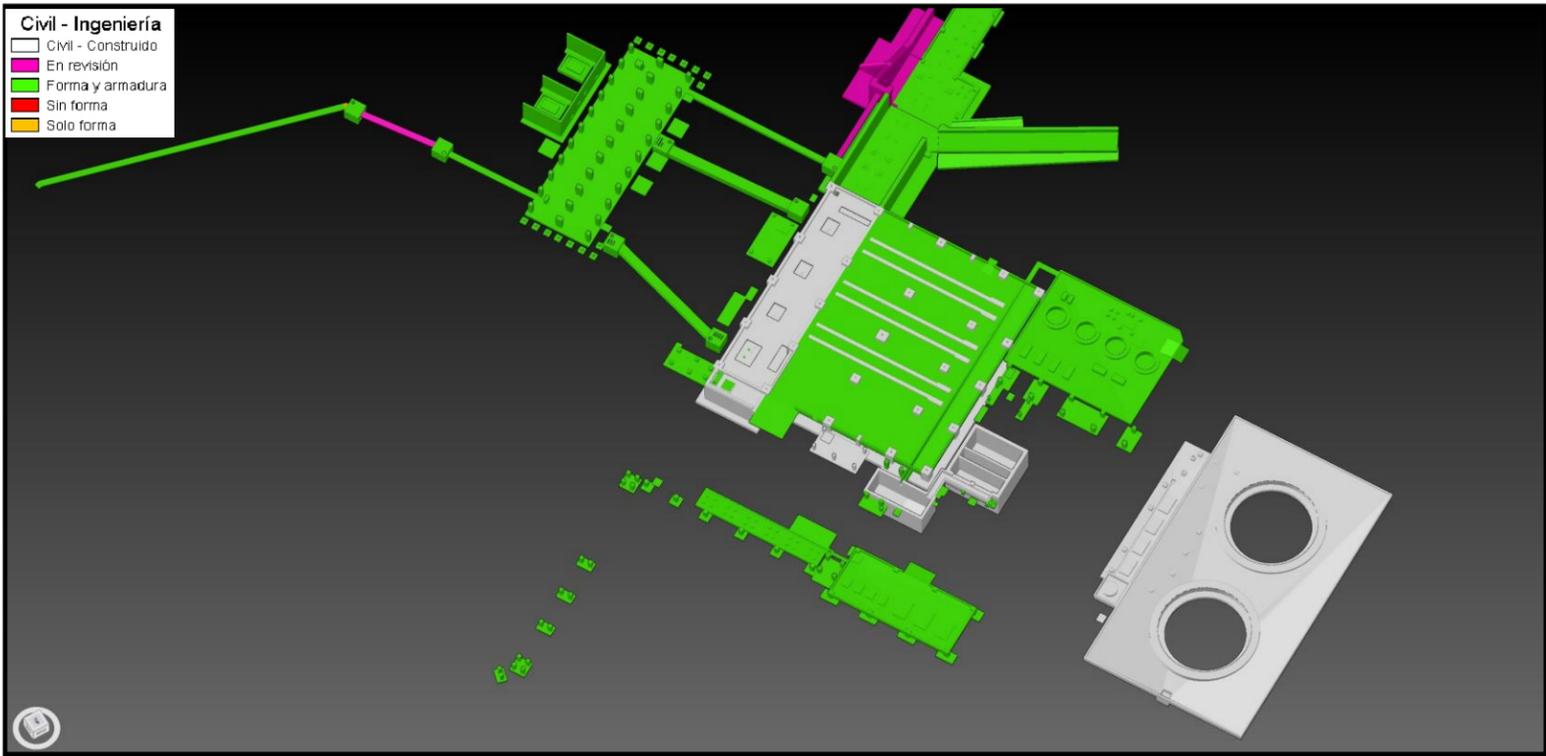

4. CURVA S PROYECTO CEDRE

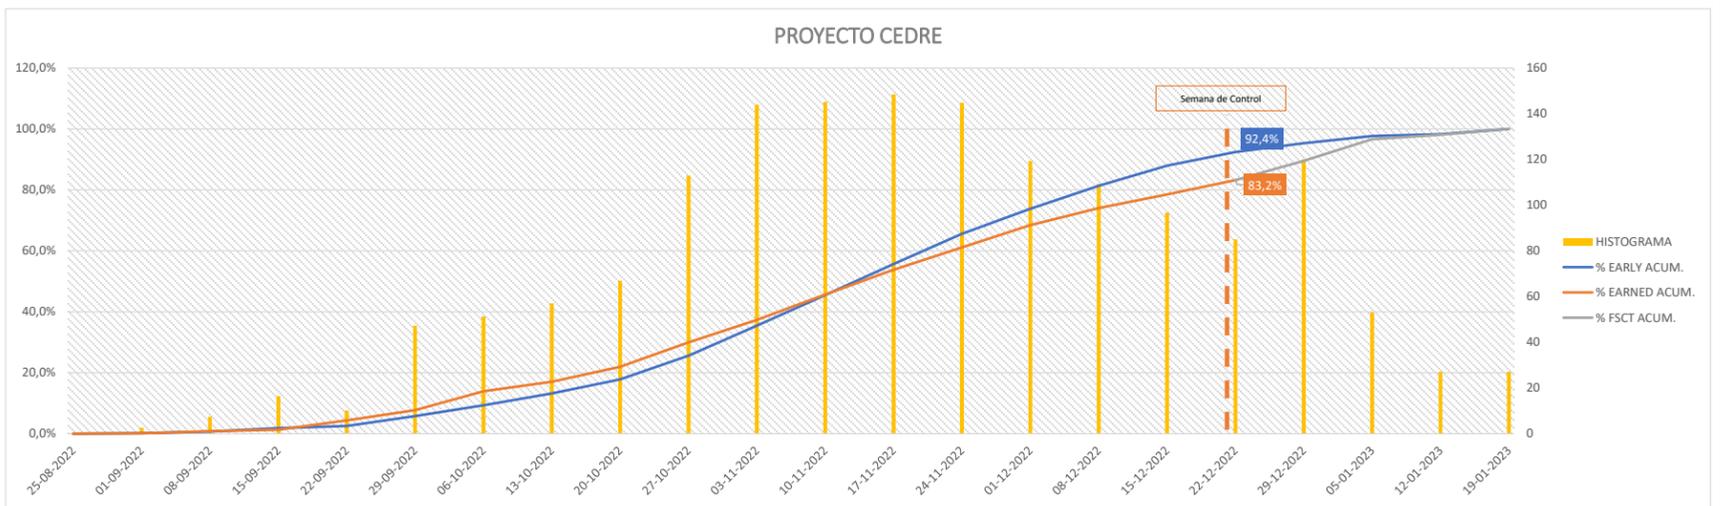

NOTA: El 22-12-22 se incluye curva de avance del proyecto K-CC-105.

AVANCE CEDRES		25-08-2022	01-09-2022	08-09-2022	15-09-2022	22-09-2022	29-09-2022	06-10-2022	13-10-2022	20-10-2022	27-10-2022	03-11-2022	10-11-2022	17-11-2022	24-11-2022	01-12-2022	08-12-2022	15-12-2022	22-12-2022	29-12-2022	05-01-2023	12-01-2023	19-01-2023
Programado Rev.0	% EARLY ACUM.	0,0%	0,2%	0,7%	1,8%	2,5%	5,8%	9,3%	13,2%	17,8%	25,6%	35,5%	45,4%	55,7%	65,6%	73,8%	81,3%	88,0%	92,4%	95,3%	97,6%	98,3%	100,0%
Avance Real	% EARNED ACUM.	0,0%	0,1%	0,8%	1,3%	4,3%	7,7%	13,9%	17,1%	22,0%	30,0%	37,3%	45,7%	53,8%	61,1%	68,4%	74,0%	78,5%	83,2%				
Forecast	% FSCT ACUM.																		83,2%	89,5%	96,6%	98,1%	100,0%
HISTOGRAMA		0	3	7	16	10	47	51	57	67	113	144	145	148	145	119	109	97	85	120	53	27	27
